

INFORMATIONSVORLAGE

IV-0004/2024
öffentlich

Amt:	Bau- und Ordnungsamt
Bearbeiter:	Claudia Schuchhardt

Datum:	01.02.2024
Aktenzeichen:	

Gremien:	Datum:	TOP:	Kenntnisnahme:
Ortschaftsrat Meitzendorf	27.02.2024		
Ortschaftsrat Ebendorf	28.02.2024		
Ortschaftsrat Barleben	29.02.2024		
Bauausschuss	05.03.2024		
Hauptausschuss	12.03.2024		
Gemeinderat	14.03.2024		

Mitzeichnung der Ämter / Bereiche:					
Zentrale Dienste (ZD)	Finanzen (FIN)	Bau- und Ordnungsamt (BOA)	Bildung und Soziales (BS)	Unternehmerbüro (UB)	Bürgermeisterbüro (BMB)

Gegenstand der Vorlage:
Sachstand zum Breitbandausbau

Beschluss

Die Ortschaftsräte, der Bauausschuss, der Hauptausschuss sowie der Gemeinderat nehmen die Thematik „Sachstand zum Breitbandausbau“ zur Kenntnis.

Frank Nase
Bürgermeister

Sachverhalt

1. Änderungsantrag Förderprogramm weiße Flecken

e-Akte: 832.5/3-16 04ST200096

Im Zusammenhang mit der Einreichung der Unterlagen des Upgrade Antrages wurde zeitgleich eine Verlängerung der Projektlaufzeit beantragt. Die Verlängerung der Projektlaufzeit wurde mittlerweile positiv beschieden. In dem Bescheid steht jedoch ausdrücklich, dass sich die Bewilligung ausschließlich auf den Bewilligungszeitraum bezieht.

Die übrigen Antragsbegehren sind nicht Gegenstand dieser Bescheidung. Diese befinden sich seitens der PWC noch in der Prüfung.

Sobald die Prüfung abgeschlossen ist ergeht ein gesonderter Bescheid. Gespräche sowie Abstimmungen über die zu erwartende Bewilligung des Upgrade Antrages werden seitens des Projektsteuerers mit der PWC geführt.

Mittelabruf beim Projektträger

Eine Entscheidung zur Höhe der Auszahlung vom beantragten Mittelabruf erfolgte seitens der PWC.

Die Auszahlung der abgerufenen Mittel in Höhe von **2.616.805,92 Euro** erfolgte noch im Dezember 2023.

2. Baufortschrittmeldung

Die Tiefbauarbeiten der Längstrassen sowie Hausanschlussstrassen sind weitestgehend abgeschlossen.

Der Ausbau der „grauen Flecken“, welche sich vorrangig in der Ortschaft Ebendorf im Cluster 3 (3. Ausbaustufe) befinden sind ebenfalls in der Endphase.

Zum momentanen Zeitpunkt sind **1.481 Adressen** dokumentiert/aktiviert. Somit sind **94%** der Adressen betriebsbereit.

In Summe wurden bisher in der Gemeinde Barleben pro Cluster bzw. Ausbaustufe Folgendes errichtet und dokumentiert:

Status	Anzahl Gebäude	Anzahl Adressen mit Vertrag	Anzahl Adressen anzu-schließen	Anzahl Adressen mit HE	Anzahl Adressen mit Kabel	Anzahl Adressen gemessen/fertig	Anzahl Adressen Dokumentiert	Adressen im Ausbau	Adressen fertig	Adressen Betriebsbereit	HA-Trasse geplant	Längstrasse geplant	HA-Trasse gebaut	Längstrasse gebaut	HA-Trasse fertig	Längstrasse fertig
Cluster 1	1.076	673	617	636	635	631	631	95%	94%	94%	7.737,76 m	27.373,52 m	8.083,97 m	27.279,73 m	104%	100%
Cluster 2	1.442	679	648	653	650	650	650	96%	96%	96%	8.625,88 m	30.454,45 m	9.010,24 m	29.862,28 m	104%	98%
Cluster 3 - Rohrvortrieb	207	92	81	81	81	81	81	88%	88%	88%	1.774,17 m	0,00 m	835,90 m	0,00 m	47%	
Cluster 3	340	130	119	119	119	119	119	92%	92%	92%	1.306,17 m	7.062,06 m	2.236,28 m	7.465,45 m	171%	106%
Ergebnis	3.065	1.574	1.465	1.489	1.485	1.481	1.481	95%	94%	94%	19.443,98 m	64.890,03 m	20.166,39 m	64.607,46 m	104%	100%


Cluster 1 = Ortschaft Meitzendorf sowie Ortschaft Barleben Nord

Cluster 2 = Ortschaft Barleben sowie kleinere Bereiche in der Ortschaft Ebendorf

Cluster 3 = Ortschaft Ebendorf sowie kleinere Bereiche in der Ortschaft Meitzendorf

3. signaltechnische Übergabe

bildliche Darstellung:

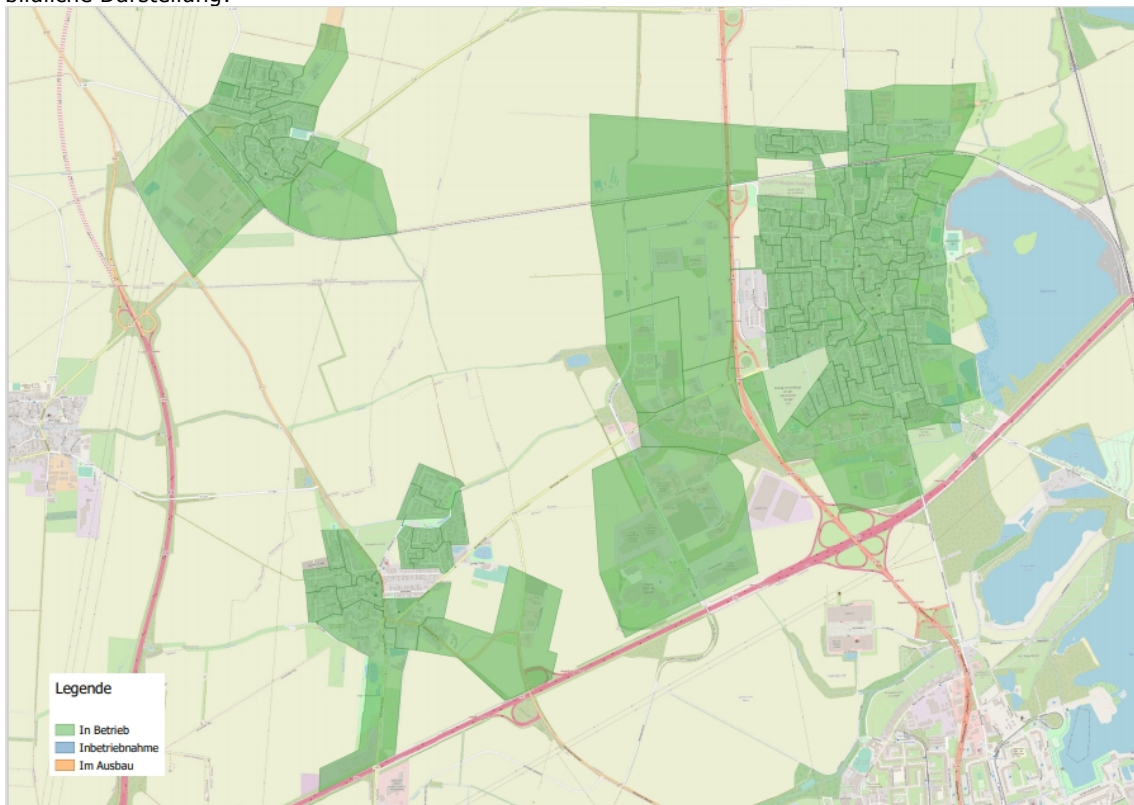

Die in „grün“ gekennzeichneten Bereiche wurden bereits an die DNS:NET Internet Service GmbH übergeben und größtenteils in Betrieb genommen. Im Zuge der Nachverdichtung werden die noch fehlenden Hausanschlüsse gebaut. Nach Fertigstellung werden diese Adresspunkte zusätzlich an die DNS:NET Internet Service GmbH gemeldet um dann aktiviert zu werden.

4. Notwendige Umverlegung der Kabeltrasse durch den Bau der BAB 14

(A 14 Magdeburg – Wittenberge – Schwerin AS Dahlenwarsleben bis AS Wolmirstedt)

Die DEGES GmbH ist von der Autobahn GmbH des Bundes beauftragt, im Namen und mit Vollmacht der Bundesrepublik Deutschland, die oben genannte Straßenbaumaßnahme zu planen, zu bauen und die mit dem Bau zusammenhängenden Verträge im Namen und auf Rechnung der Bundesrepublik Deutschland abzuschließen und abzuwickeln.

Eine Umverlegung der bereits vorhandenen Kabeltrasse sowie des Schachtes inkl. der Übergabemuffe, welche zur Backbone Trasse als Verbindung zu Los 6 (Niedere Börde) dient, ist durch den Ausbau der BAB 14 notwendig.

Da die Gemeinde Barleben in einem zweiten Bauabschnitt betroffen sein wird, wird sich auch der bereits geplante Zeitraum dieses Bauabschnittes nach hinten verlagern. Diese Bauverzögerung, auch aufgrund des Vorkommens des Feldhamsters, beläuft sich eventuell bis ins Jahr 2025.

5. Information zur Abnahme der Verkehrsflächen durch die Gemeinde

Eine förmliche Abnahme gem. VOB/B ist weiterhin noch nicht erfolgt. Inaugenscheinnahmen der Oberflächen wurden in den 3 Ortschaften vorgenommen.

Die bei der Oberflächensichtungen erkannten Mängel, wurden zur Beseitigung bei der Firma TKI GmbH angezeigt. Diese Mängelbeseitigung wird derzeit weiterhin durchgeführt.

Die förmliche Abnahme gem. VOB/B erfolgt nach Fertigstellung der Baumaßnahme. Einen Zeitpunkt zur Abnahme kann ferner nicht bestimmt werden. Das Gesamtwerk ist gemäß Totalunternehmervertrag (TÜ-Vertrag) nicht vollendet. Zur letztendlichen Fertigstellung gehören neben der Bautätigkeit u.a. ebenfalls die Vermessung sowie Dokumentation.

6. Ausblick bis 31.03.2024

Fertigstellungstermine wie u.a. die signaltechnischen Übergaben stellen sich wie folgt dar:

Cluster 1 (OS Meitzendorf):	Ende Juni 2023
Cluster 1 (OS Barleben):	Ende Juli 2023
Cluster 2:	Ende August 2023
Cluster 3:	Ende Oktober 2023

Die entsprechende vereinzelte Nachverdichtung erfolgt zum momentanen Zeitpunkt parallel.

Die entsprechenden Vermessungs- und Dokumentationsleistungen erfolgen im Nachgang. Diese können zum jetzigen Stand nicht abschließend terminiert werden.


7. Abschluss Meeting 2024

Im Juni dieses Jahres ist ein Abschluss Meeting bzgl. des Breitbandausbaus mit den Beteiligten sowie den entsprechenden Mitgliedern der ARGE in der Ziegelei Hundisburg geplant.

Tenor: 100 % Ausbau des ARGE-Netzes

Zeitgleich soll die Veranstaltung auch als Werbemaßnahme dienen. Im Gespräch ist auch, dass die Mitgliedsgemeinden eine entsprechende Stele bzgl. der o.g. Werbemaßnahme in den jeweiligen Gemeinden setzen zu lassen.

Eine bildliche Abbildung als Vorschlag einer entsprechenden Stele seitens der Stabstelle Breitband aus der letzten ARGE Sitzung im Dezember 2023.



8. Kontaktdaten der DNS:NET Internet Service GmbH

Bei eventuell auftretenden Fragen im Zusammenhang mit dem Internet- oder Telefonanschluss sowie Problemen hinsichtlich der Inbetriebnahme können sich die entsprechenden Anschlussnehmer an den Kundenservice der DNS:NET Internet Service GmbH wenden.

Kontaktdaten auf einen Blick:

Alle Kontaktdaten für Sie im Überblick

Privatkunden
Allgemeine Fragen
(Tarife, Verträge, sonstiges)

Telefon: 030 66765 444
privatkunden-boerde@dns-net.de

**Havarie &
Störungen**

Telefon: 030 66765 111
support@dns-net.de

Geschäftskunden
Allgemeine Fragen
(Tarife, Verträge, sonstiges)

Telefon: 030 66765 100 geschaeftskunden-boerde@dns-net.de

**Beschwerden &
Eskalation**

programmleiter-boerde@dns-net.de

Inbetriebnahme
Fragen rund um die Inbetriebnahme

Telefon: 030 66765 103
inbetriebnahme-boerde@dns-net.de

Anfragen von Medienvertretern

Telefon: 030 66765 128
presse@dns-net.de

Begründung für Status „nicht öffentlich“: entfällt
