

Abrechnung der Projekte
Sporthalle II und
Erweiterung der
Mittellandhalle - Verbinder
(Stand 22.11.2013)

Kostenübersicht Projekt - Sporthalle II nach Ausgaben/Jahr brutto		(Stand 22.11.2013)		
Art der Kosten	Gesamtkosten/Jahr			
Baukosten 2011	1.339.726,60 €			
Baukosten 2012	3.618.939,42 €			
Baukosten 2013	-51.456,75 €	Erläuterung siehe unten!		
Baunebenkosten 2011	446.111,12 €			
Baunebenkosten 2012	212.328,71 €			
Baunebenkosten 2013	87.507,33 €			
Baunebenkosten (noch nicht ausgezahlt)	25.589,91 €			
Begrünung (es liegt noch keine geprüfte Abrechnung vor; Auftragssumme + Nachtrag Pflanzkübel)	6.837,20 €			
	5.685.583,54 €			
Kostenübersicht Projekt - Verbinder nach Ausgaben/Jahr brutto				
Art der Kosten	Gesamtkosten/Jahr			
Baukosten 2011	752.200,43 €			
Baukosten 2012	2.276.898,25 €			
Baukosten 2013	578.901,90 €			
Baunebenkosten 2011	320.390,35 €			
Baunebenkosten 2012	165.163,48 €			
Baunebenkosten 2013	52.587,53 €			
Baunebenkosten (noch nicht ausgezahlt)	43.736,71 €			
Begrünung (es liegt noch keine geprüfte Abrechnung vor; Auftragssumme + Nachtrag Pflanzkübel)	6.837,20 €			
	4.196.715,85 €			
Summe Sporthalle gesamt:	5.685.583,54 €			
Summe Verbinder gesamt:	4.196.715,85 €			
Kosten Sporthalle und Verbinder gesamt:	9.882.299,39 €			
Erläuterung Minusbetrag: Der Minusbetrag ergibt sich aus einer Umbuchung nach der Schlussrechnung der Fa. Elektro Maaß vom Projekt Sporthalle in das Projekt Verbinder in Höhe von 176058,96 €.				


Kostenentwicklung im Überblick

Sporthalle II


Verbinder

Kosten zusammengefasst


Sporthalle II

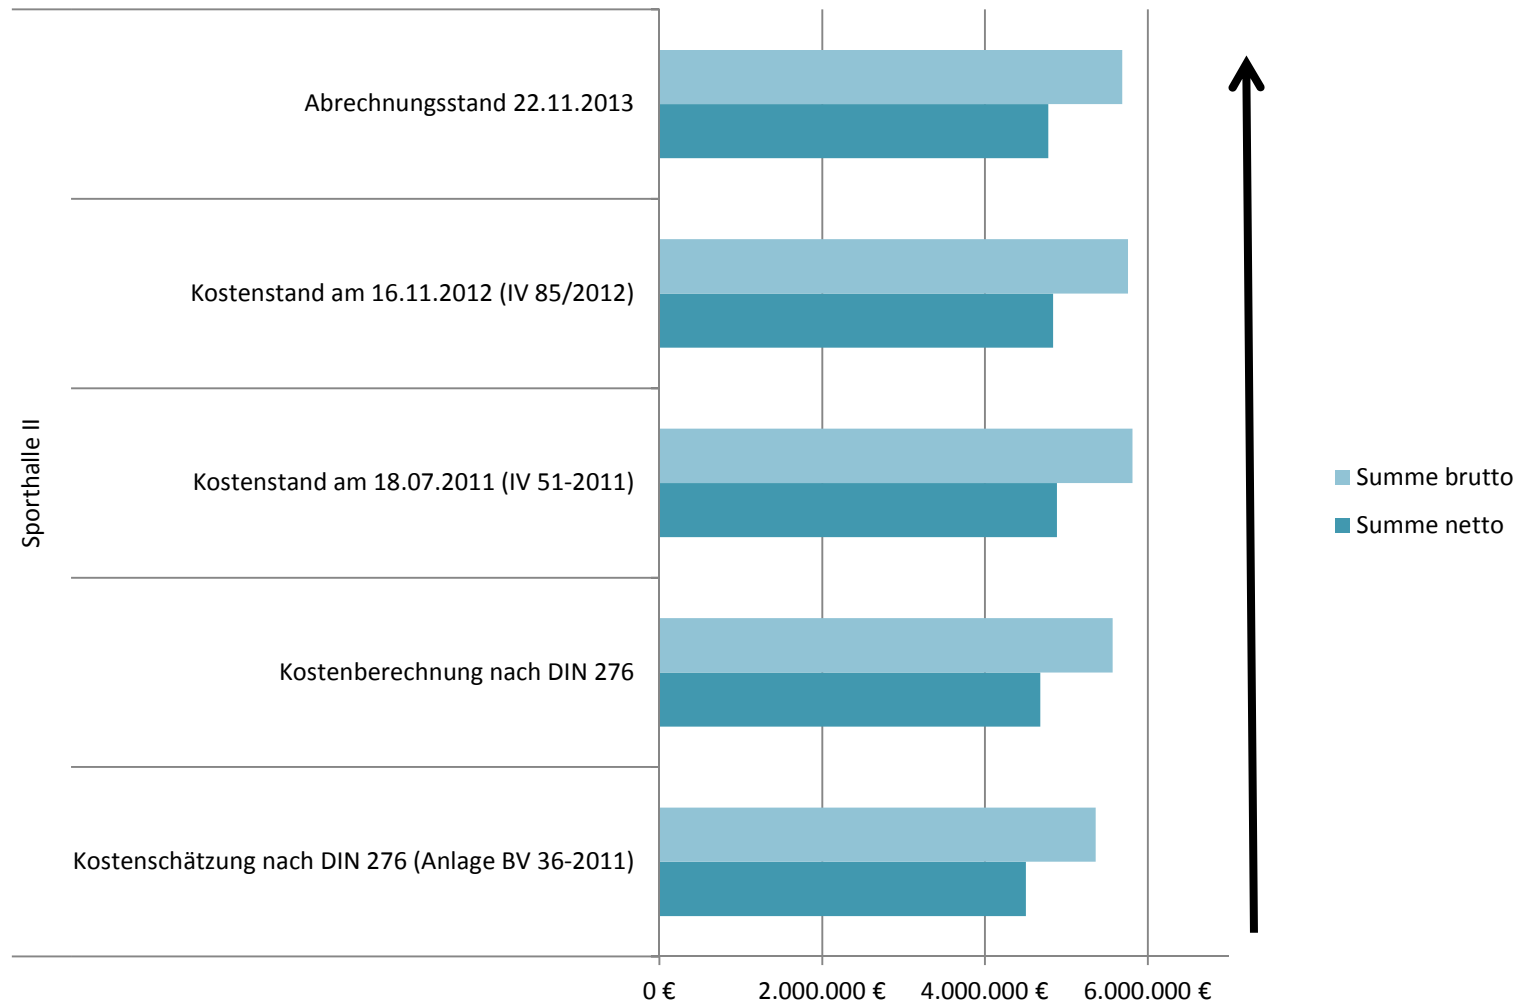

Verbinder

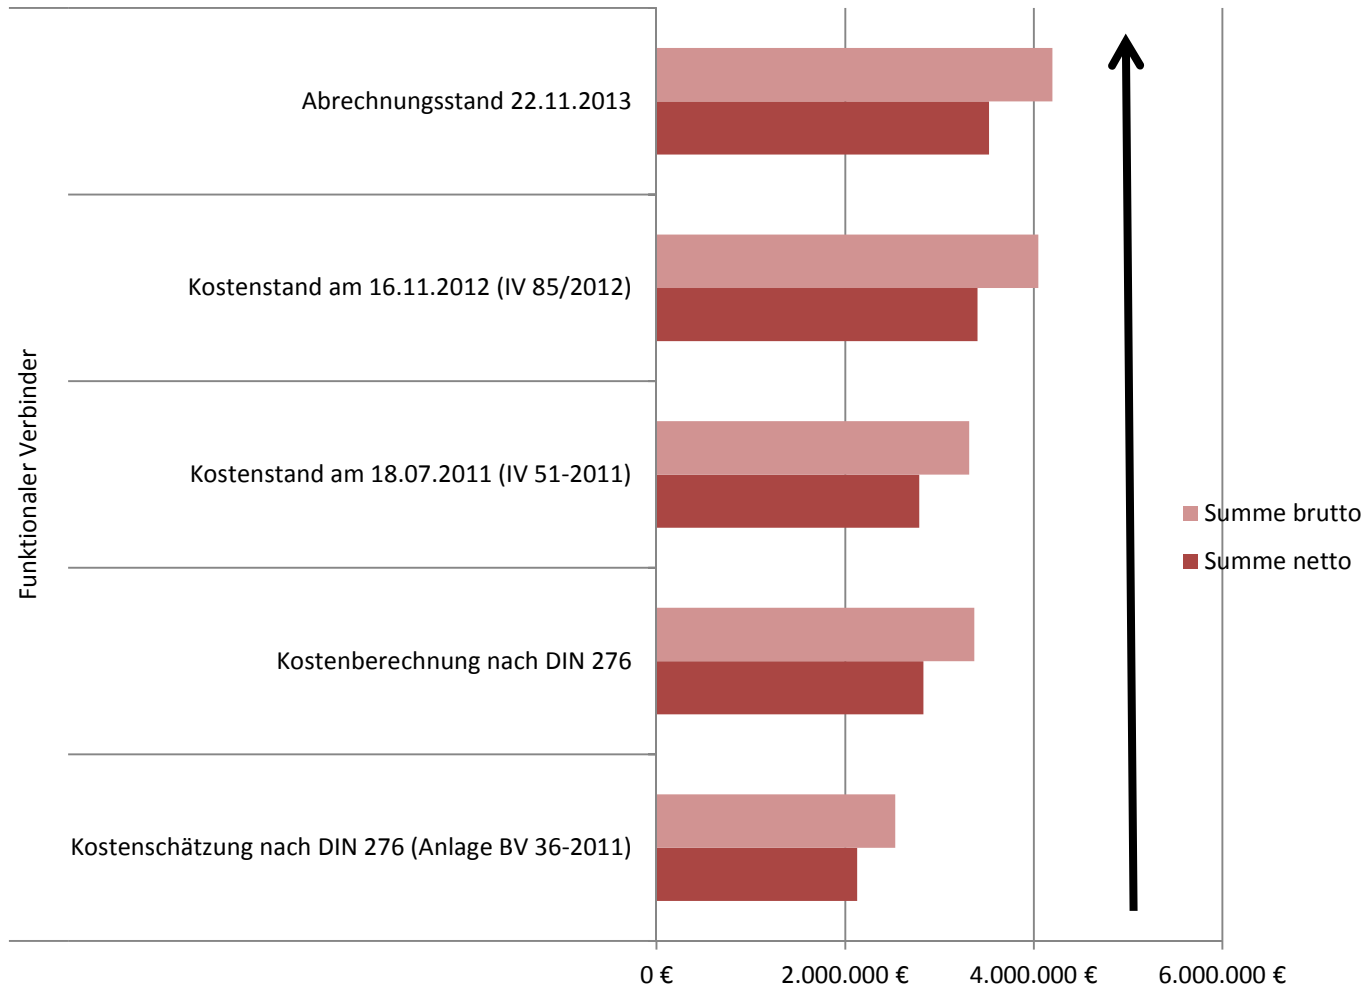

Gesamtkosten Sporthalle II und Verbinder

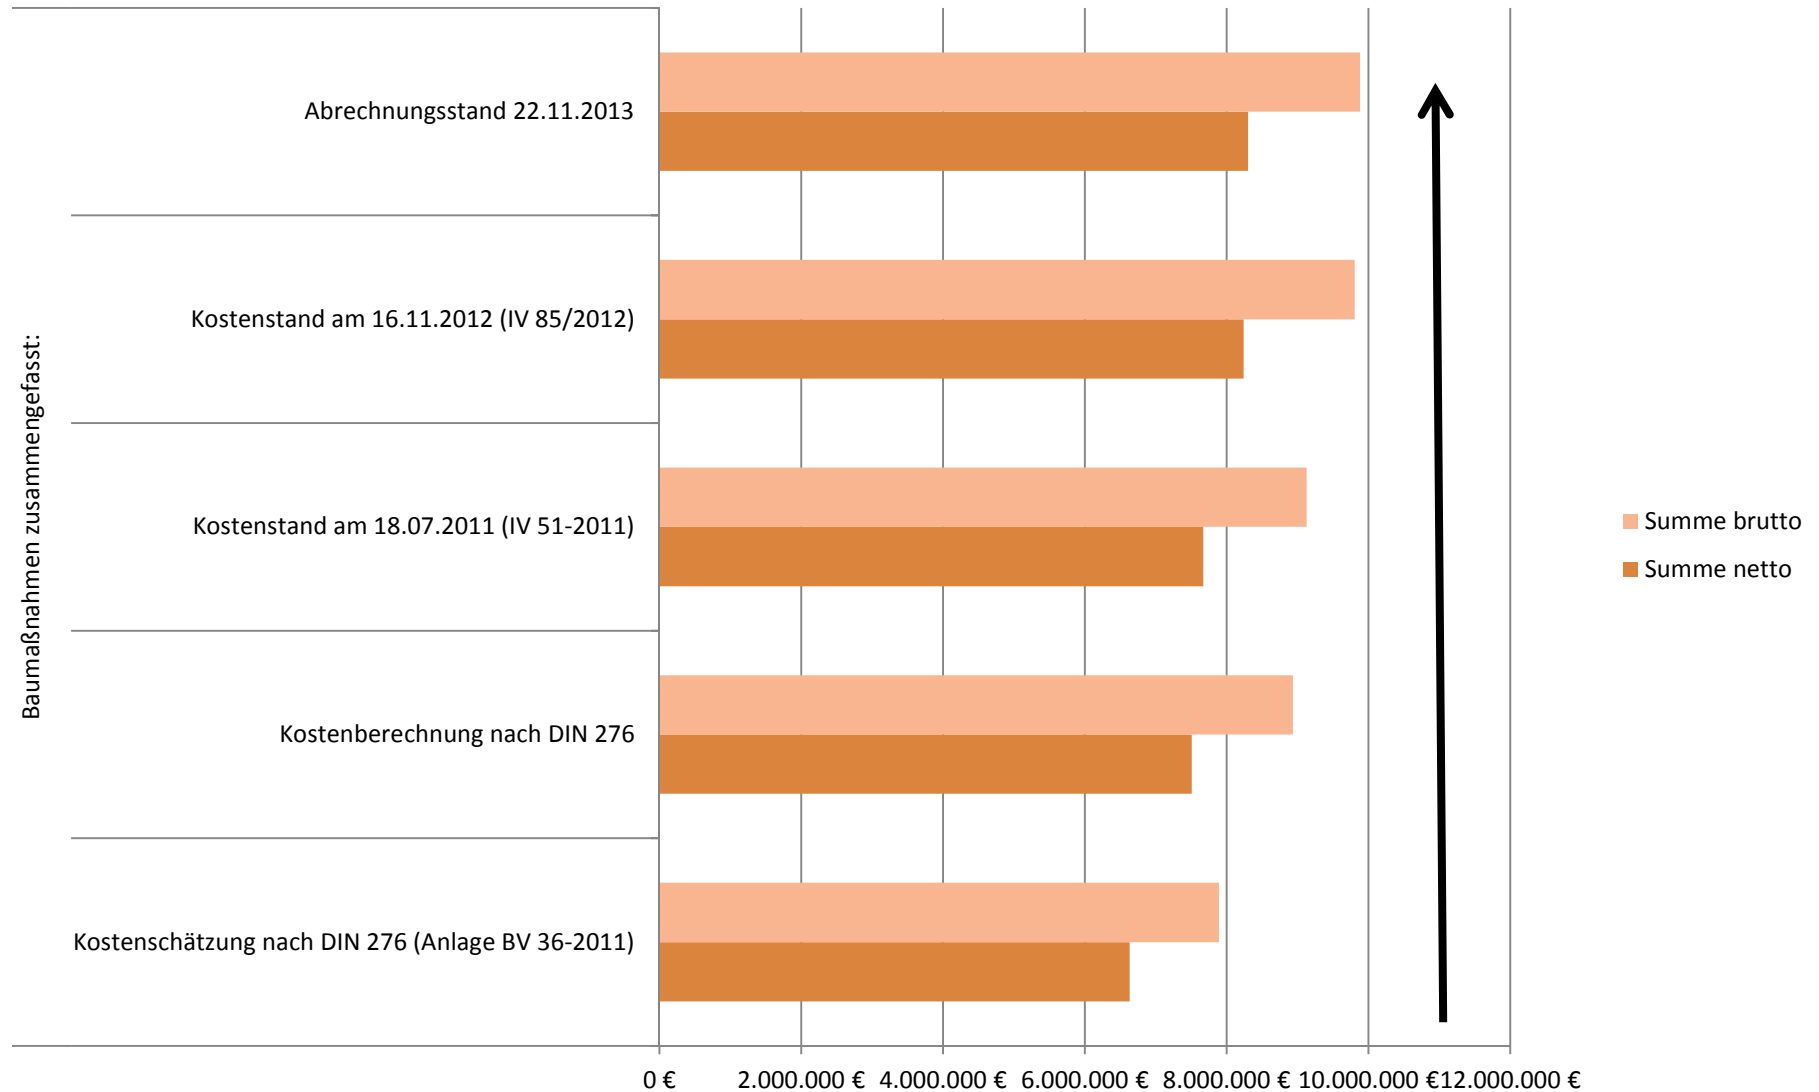

Kostenentwicklung als Tabelle

Sporthalle II					
	Kostenschätzung nach DIN 276 (Anlage BV 36-2011)	Kostenberechnung nach DIN 276	Kostenstand am 18.07.2011 (IV 51-2011)	Kostenstand am 16.11.2012 (IV 85/2012)	Abrechnungsstand 22.11.2013
Summe netto	4.504.566 €	4.678.399 €	4.884.848 €	4.837.916 €	4.777.801 €
Summe brutto	5.360.433 €	5.567.295 €	5.812.969 €	5.757.120 €	5.685.584 €
Funktionaler Verbinder					
	Kostenschätzung nach DIN 276 (Anlage BV 36-2011)	Kostenberechnung nach DIN 276	Kostenstand am 18.07.2011 (IV 51-2011)	Kostenstand am 16.11.2012 (IV 85/2012)	Abrechnungsstand 22.11.2013
Summe netto	2.127.101 €	2.830.480 €	2.786.161 €	3.402.024 €	3.526.651 €
Summe brutto	2.531.250 €	3.368.271 €	3.315.532 €	4.048.409 €	4.196.715 €
Baumaßnahmen zusammengefasst:					
	Kostenschätzung nach DIN 276 (Anlage BV 36-2011)	Kostenberechnung nach DIN 276	Kostenstand am 18.07.2011 (IV 51-2011)	Kostenstand am 16.11.2012 (IV 85/2012)	Abrechnungsstand 22.11.2013
Summe netto	6.631.666 €	7.508.879 €	7.671.009 €	8.239.940 €	8.304.453 €
Summe brutto	7.891.683 €	8.935.566 €	9.128.501 €	9.805.529 €	9.882.299 €
