

## INFORMATIONSVORLAGE

**IV-0015/2024**  
**öffentlich**

Amt:	Bau- und Ordnungsamt
Bearbeiter:	Claudia Schuchhardt

Datum:	05.11.2024
Aktenzeichen:	

<b>Gremien:</b>	<b>Datum:</b>	<b>TOP :</b>	<b>Kenntnisnahme:</b>
Ortschaftsrat Meitzendorf	19.11.2024		
Ortschaftsrat Ebendorf	20.11.2024		
Ortschaftsrat Barleben	21.11.2024		
Bauausschuss	26.11.2024		
Hauptausschuss	03.12.2024		
Gemeinderat	17.12.2024		

**Gegenstand der Vorlage:**  
Sachstand Breitbandausbau

### **Beschluss**

**Die Ortschaftsräte, der Bauausschuss, der Hauptausschuss sowie der Gemeinderat nehmen die Thematik „Sachstand zum Breitbandausbau“ zur Kenntnis.**

Frank Nase  
Bürgermeister

## Sachverhalt

### 1. Änderungsantrag Förderprogramm weiße Flecken

#### e-Akte: 832.5/3-16 04ST200096

Der Änderungsbescheid über die Zuwendung in endgültiger Höhe hinsichtlich des Upgrade Antrages auf Hinzuziehung der Grauen Flecken in das bestehende weiße Flecken Programm wurde im Juni 2024 seitens der PWC im Online Portal übermittelt.

Zudem wurde aufgrund der noch zu erfüllenden Restarbeiten eine Verlängerung der Projektlaufzeit beantragt.  
Eine Mitteilung dazu erhielt die Gemeinde Barleben am 28.10.2024.

Auszug Bescheid:

Sehr geehrte Damen und Herren,

auf Grundlage Ihres oben angegebenen Änderungsantrags wird der Zuwendungsbescheid vom 21.03.2017, zuletzt geändert mit Bescheid vom 03.06.2024, wie folgt geändert:

Der Bewilligungszeitraum erstreckt sich nunmehr vom 28.11.2016 bis zum 31.03.2025.

#### Mittelabruf beim Projektträger

Bisher erfolgten durch die Gemeinde Barleben Mittelabrufe in den Jahren 2021 und 2023. Eine Entscheidung zur Höhe der Auszahlung der beantragten Mittelabrufe wurde seitens der PWC vorgenommen.

Bewilligt wurden der Gemeinde Barleben aufgrund des Upgrade-Antrages Zuwendungen in Höhe von 7.889.287,00 Euro.

Auszahlungen der abgerufenen Mittel in den Jahren 2021 und 2023 erfolgten in Höhe von:

HH 2021	2.197.770,00 Euro
HH 2023	2.616.805,92 Euro

Die Gemeinde Barleben hat fristgerecht einen 3. Mittellabruf eingereicht. Somit sollte die Auszahlung der Mittelanforderung noch im Haushaltsjahr 2024 erfolgen. Die Höhe der Anforderung beläuft sich auf 1.597.499,74 Euro. Eine Entscheidung, ob die Auszahlung in voller Summe erfolgt, wird vom Fördermittelgeber getroffen.

Zum Änderungsbescheid wurden Nebenbestimmungen benannt, welche bis zum 30.09.2024 zu erfüllen waren. Auch für die Erfüllung der Nebenbestimmungen hat die Gemeinde aufgrund der o.g. Laufzeitverlängerung einen zeitlichen Puffer erhalten.

## 2. Baufortschrittmeldung / signaltechnische Übergabe

Die Tiefbauarbeiten der Längstrassen sowie Hausanschlussstrassen sind weitestgehend abgeschlossen. Wenige Restarbeiten bzw. Nacharbeiten sollen bis Ende des Jahres 2024 ausgeführt werden.

Signaltechnisch wurden alle Bereiche der 3 Ortschaften an die DNS:NET Internet Service GmbH übergeben. Auch die entsprechenden Aktivierungen sind bereits vorgenommen worden. Nach Vollendung der Restarbeiten werden auch die noch zu aktivierenden Hausanschlüsse durch die DNS:NET Internet Service GmbH aktiviert.

## 3. Notwendige Umverlegung der Kabeltrasse durch den Bau der BAB 14


*(A 14 Magdeburg – Wittenberge – Schwerin AS Dahlenwarsleben bis AS Wolmirstedt)*

*Die DEGES GmbH ist von der Autobahn GmbH des Bundes beauftragt, im Namen und mit Vollmacht der Bundesrepublik Deutschland, die oben genannte Straßenbaumaßnahme zu planen, zu bauen und die mit dem Bau zusammenhängenden Verträge im Namen und auf Rechnung der Bundesrepublik Deutschland abzuschließen und abzuwickeln.*

Die erforderliche Umverlegung der bereits vorhandenen Kabeltrasse sowie des Schachtes inkl. der Übergabemuffe, welche zur Backbone Trasse als Verbindung zu Los 6 (Niedere Börde) dient, ist seitens der Gemeinde Barleben erfolgt.

Im Bereich des Knotens B71/K1167 wurde der bestehende Kabelschacht seitens TKI-Chemnitz außerhalb des späteren Baufeldes der BAB14 in Richtung Meitzendorf verlegt. Dabei wurde die bestehende Datentrasse entsprechend eingekürzt und aus Richtung Meitzendorf in den Schacht geführt. Der spätere Um- bzw. Aufbindepunkt liegt somit unmittelbar hinter der Baufeldgrenze auf der Südseite der K1167 in Richtung Meitzendorf.

Die folgende Abbildung (ohne Maßstab) zeigt den vorherigen sowie den neuen Standort des Schachtes.

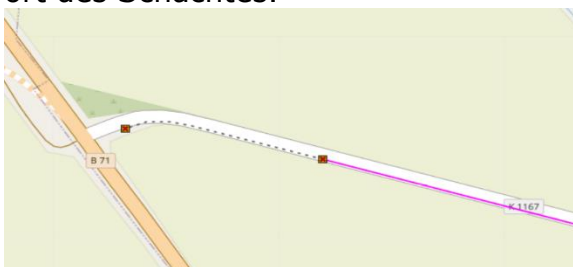

Bildliche Darstellung des Schachtes äußerlich sowie Innenansicht:



#### **4. Information zur Abnahme der Verkehrsflächen durch die Gemeinde**

Eine Abnahme des Gesamtwerkes wird parallel zu den noch laufenden Maßnahmen seitens des Projektsteuerers weiterhin vorbereitet. Die bei der Oberflächensichtungen erkannten Mängel, wurden zur Beseitigung bei der Firma TKI GmbH angezeigt. Die förmliche Abnahme gem. VOB/B erfolgt nach endgültiger Fertigstellung der Baumaßnahme. Einen Zeitpunkt zur Abnahme kann ferner nicht bestimmt werden. Das Gesamtwerk ist gemäß Totalunternehmervertrag (TÜ-Vertrag) nicht vollendet. Zur letztendlichen Fertigstellung gehören neben der Bautätigkeit u.a. ebenfalls die Vermessung sowie Dokumentation.

#### **5. Ausblick bis 31.03.2025**

Fertigstellung der Nacharbeiten soll bis Ende 2024 erfolgen. Die Vorbereitung des Abnahmeprozesses sowie das Zusammenstellen der Verwendungsnachweise, in der entsprechend geforderten Form seitens des Fördermittelgebers, wird parallel durchgeführt und erarbeitet.

#### **6. Neues Portfolio der DNS:NET Internet Service GmbH ab 01.11.2024**

Die DNS:NET Internet Service GmbH hat für den Bereich Börde ihre Tarife zum 01.11.2024 angepasst um zum Teil attraktiver sowie flexibler gestaltet.

Auf der Internetseite <https://shop.dns-net.de/> können die neuen Tarife und Konditionen eingesehen werden. Die neuen Tarife gelten für Neukunden. Für Bestandskunden ändert sich zunächst nichts. Jedoch soll die Möglichkeit eines Tarifwechsels bestehen.

**Tarifübersicht FTTH\* (Glasfaser-Internet, Telefon)**  
**Neu ab 01.11.2024**

Tarifwechsel  
nach 6 Monaten  
möglich!

Inkl.  
IPTV Premium  
Plus\*



	NETZPOWER S	NETZPOWER M	NETZPOWER L	NETZPOWER XL	DERTarif	NETZPOWER MAX
	<b>100 MBit/s</b> Download	<b>300 MBit/s</b> Download	<b>600 MBit/s</b> Download	<b>1.000 MBit/s</b> Download	<b>1.000 MBit/s</b> Download	<b>2.500 MBit/s</b> Download
Upload (bis zu)	50 MBit/s	150 MBit/s	300 MBit/s	500 MBit/s	500 MBit/s	1.000 MBit/s
Telefon Basic inkl. 1 Rufnummer <sup>1</sup>	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Festnetz-Flatrate ins deutsche Festnetz <sup>2</sup>	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mobil-Flatrate ins deutsche Mobilfunknetz <sup>3</sup>	-	9,99 € mtl.	✓	✓	✓	✓
Router vorkonfiguriert <sup>4</sup>	4,99 € mtl. 9,99 € einmalig	4,99 € mtl. 9,99 € einmalig	4,99 € mtl. 9,99 € einmalig	4,99 € mtl. 9,99 € einmalig	✓ 9,99 € einmalig	9,99 € mtl. 9,99 € einmalig
Telefon Komfort 2 - 10 Rufnummern <sup>1</sup>	4,99 € mtl.	4,99 € mtl.	4,99 € mtl.	4,99 € mtl.	4,99 € mtl.	4,99 € mtl.
1 Feste IP-Adresse <sup>5</sup>	9,99 € mtl.	9,99 € mtl.	9,99 € mtl.	9,99 € mtl.	9,99 € mtl.	9,99 € mtl.
Laufzeit in Monaten	24	24	24	12/24	6/24*	12/24
Bereitstellungsgebühr	49 € einmalig	49 € einmalig	49 € einmalig	49 € einmalig	49 € einmalig	49 € einmalig
Preis pro Monat	<b>44,99 €</b> mtl.	<b>52,99 €</b> mtl.	<b>59,99 €</b> mtl.	<b>79,99 €</b> mtl. <sup>6</sup> ab 24 Monaten Laufzeit	<b>19,99 €</b> mtl. <sup>7</sup> ab 7 Monaten 74,99 €	<b>89,99 €</b> mtl. <sup>8</sup> ab 24 Monaten Laufzeit

1



**Begründung für Status „nicht öffentlich“:**

**Finanzielle Auswirkungen**

Kosten der Bearbeitung in EUR	<b>« 120,00 »</b>
-------------------------------	-------------------

**Anlagen**
