

## INFORMATIONSVORLAGE

**IV-0010/2024**  
**öffentlich**

Amt:	Bau- und Ordnungsamt
Bearbeiter:	Claudia Schuchardt

Datum:	13.08.2024
Aktenzeichen:	

<b>Gremien:</b>	<b>Datum:</b>	<b>TOP:</b>	<b>Kenntnisnahme:</b>
Ortschaftsrat Meitzendorf	27.08.2024		
Ortschaftsrat Ebendorf	28.08.2024		
Ortschaftsrat Barleben	29.08.2024		
Bauausschuss	03.09.2024		
Hauptausschuss	17.09.2024		
Gemeinderat	24.09.2024		

**Gegenstand der Vorlage:**  
Sachstand zum Breitbandausbau

**Beschluss**  
**Die Ortschaftsräte, der Bauausschuss, der Hauptausschuss sowie der Gemeinderat nehmen die Thematik „Sachstand zum Breitbandausbau“ zur Kenntnis.**

Frank Nase  
Bürgermeister

## Sachverhalt

### 1. Änderungsantrag Förderprogramm weiße Flecken

**e-Akte: 832.5/3-16 04ST200096**

Der Änderungsbescheid über die Zuwendung in endgültiger Höhe hinsichtlich des Upgrade Antrages auf Hinzuziehung der Grauen Flecken in das bestehende weiße Flecken Programm wurde im Juni 2024 seitens der PWC im Online Portal übermittelt.

Nachfolgende eine kurze Zusammenfassung aus den Angaben im Änderungsbescheid.

Bezug:

Zuwendungsbescheid vom 21.03.2017,  
zuletzt geändert mit Bescheid vom 09.01.2024

elektronischer Änderungsantrag vom 21.11.2023,  
mit Nachlieferung bis zum 31.05.2023

Aktenzeichen: 832.5/3-16 04ST200096

Sehr geehrte Damen und Herren,

auf Grundlage Ihres oben angegebenen Änderungsantrags wird der Zuwendungsbescheid vom 21.03.2017, zuletzt geändert mit Bescheid vom 09.01.2024, wie folgt geändert:

Wir bewilligen Ihnen als Projektförderung eine weitere nicht rückzahlbare Zuwendung in Höhe von bis zu:

**1.609.910,00 Euro**

(eine Million sechshundertneuntausendneuhundertzehn Euro, null Cent)

höchstens jedoch in Höhe von 50 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben (Anteilsfinanzierung) für die Durchführung der von Ihnen geplanten Baumaßnahmen zur Errichtung einer passiven Infrastruktur im Sinne des Betreibermodells nach Nr. 3.2 der Breitband-Richtlinie.

Die für das Vorhaben bewilligte Zuwendung in Höhe von bis zu **6.279.377,00 Euro\*** erhöht sich damit insgesamt auf

**7.889.287,00 Euro**

(sieben Millionen achthundertneunundachtzigtausendzweihundertsiebenundachtzig Euro, null Cent).

Wie im Auszug ersichtlich, werden die Kosten jedoch höchstens in Höhe von 50 % der zuwendungsfähigen Ausgaben (Anteilsfinanzierung) gewährt.

Die Zuwendung in Höhe von 788.928,70 Euro (10% der Zuwendung) gilt als Sicherheitseinbehalt. Die Auszahlung erfolgt erst nach und entsprechend der Ergebnisse der Prüfung des Verwendungsnachweises.

### Mittelabruf beim Projektträger

Bisher erfolgten durch die Gemeinde Barleben Mittelabrufe in den Jahren 2021 und 2023. Eine Entscheidung zur Höhe der Auszahlung der beantragten Mittelabrufe wurde seitens der PWC vorgenommen.

Auszahlungen der abgerufenen Mittel erfolgten in Höhe von:

HH 2021	2.197.770,00 Euro
HH 2023	2.616.805,92 Euro

Somit kann die Gemeinde Barleben aufgrund der neuen Bewilligung und der bisherigen Mittelabrufe Zuwendungen in Höhe von 3.074.711,08 Euro beim Fördermittelgeber abrufen. Zum Änderungsbescheid wurden Nebenbestimmungen benannt, welche bis zum 30.09.2024 zu erfüllen sind. Größtenteils beziehen sich die Nebenbestimmung auf die Beschriftungen bzw. Benennung der Netztechnik. Diese Umbenennungen werden durch unseren Auftragnehmer durchgeführt.

## 2. Baufortschrittmeldung / signaltechnische Übergabe

Die Tiefbauarbeiten der Längstrassen sowie Hausanschlussstrassen sind weitestgehend abgeschlossen. Wenige Restarbeiten bzw. Nacharbeiten werden im kommenden Quartal durchgeführt.

Im Rahmen der Maßnahme zum Breitbandausbau wurde im gesamten Gemeindegebiet 102 km Tiefbau realisiert. Dabei wurden 493,4 km Glasfaser und 184,2 km Leerrohre neu geschaffen.


Nach Ende der Maßnahme werden 4.105 Haushalt, 953 Unternehmen sowie die Klassen von 4 Schulen und 14 institutionelle Nachfrager zuverlässig mit Bandbreiten von mindestens 50 Mbit/s versorgt.

Signaltechnisch wurden alle Bereiche der 3 Ortschaften an die DNS:NET Internet Service GmbH übergeben. Auch die entsprechenden Aktivierungen sind bereits vorgenommen worden.


In den folgenden bildlichen Darstellungen sind die in „grün“ und „blau“ gekennzeichneten Bereiche der ersten sowie zweiten Ausbaustufe zuzuordnen. Bereiche mit der „grauen“ Kennzeichnung beinhalten die Grauen Flecken, welche mit dem Änderungsantrag eingereicht und bewilligt wurden. Die orangefarbenen Gebiete wurden seitens der DNS:NET Internet Service GmbH eigenwirtschaftlich ausgebaut.

Die in „grün“ gekennzeichneten Bereiche wurden bereits an die DNS:NET Internet Service GmbH übergeben und größtenteils in Betrieb genommen. Im Zuge der Nachverdichtung werden die noch fehlenden Hausanschlüsse gebaut. Nach Fertigstellung werden diese Adresspunkte zusätzlich an die DNS:NET Internet Service GmbH gemeldet um dann aktiviert zu werden.


Ortschaft Barleben

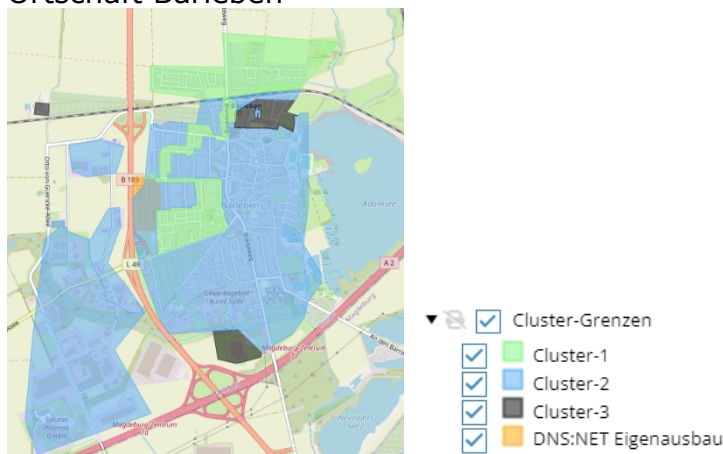

Ortschaft Ebendorf

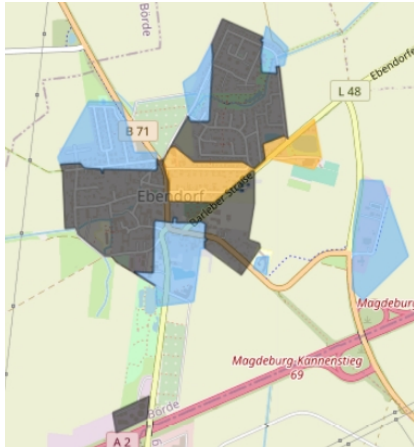

Ortschaft Meitzendorf

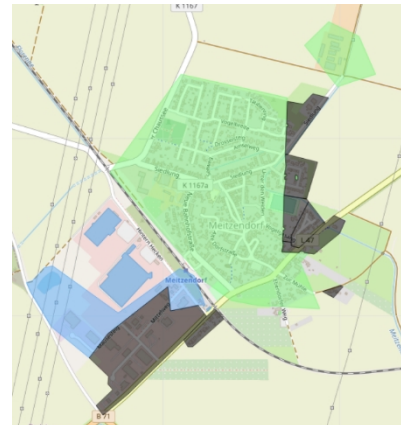

### 3. Notwendige Umverlegung der Kabeltrasse durch den Bau der BAB 14

*(A 14 Magdeburg – Wittenberge – Schwerin AS Dahlenwarsleben bis AS Wolmirstedt)  
Die DEGES GmbH ist von der Autobahn GmbH des Bundes beauftragt, im Namen und mit Vollmacht der Bundesrepublik Deutschland, die oben genannte Straßenbaumaßnahme zu planen, zu bauen und die mit dem Bau zusammenhängenden Verträge im Namen und auf Rechnung der Bundesrepublik Deutschland abzuschließen und abzuwickeln.*

Eine Umverlegung der bereits vorhandenen Kabeltrasse sowie des Schachtes inkl. der Übergabemuffe, welche zur Backbone Trasse als Verbindung zu Los 6 (Niedere Börde) dient, ist durch den Ausbau der BAB14 notwendig.

Im Bereich des Knotens B71/K1167 soll der bestehende Kabelschacht seitens TKI-Chemnitz außerhalb des späteren Baufeldes der BAB14 in Richtung Meitzendorf verlegt werden. Die bestehende Datentrasse wird entsprechend eingekürzt und aus Richtung Meitzendorf in den Schacht geführt. Der spätere Um- bzw. Aufbindepunkt liegt somit unmittelbar hinter der Baufeldgrenze auf der Südseite der K1167 in Richtung Meitzendorf.

In einer Planungsbesprechung im Juni 2024 wurde abgestimmt, dass die Arbeiten zeitnah zum Maßnahmenbeginn der Umverlegung voraussichtlich zum 01.10.2024 erfolgen.

### 4. Information zur Abnahme der Verkehrsflächen durch die Gemeinde

Eine Abnahme des Gesamtwerkes wird parallel zu den noch laufenden Maßnahmen seitens des Projektsteuerers vorbereitet. Die bei der Oberflächensichtungen erkannten Mängel, wurden zur Beseitigung bei der Firma TKI GmbH angezeigt. Diese Mängelbeseitigung soll seitens der Nachunternehmer unseres Auftragnehmers durchgeführt werden.

Die förmliche Abnahme gem. VOB/B erfolgt nach endgültiger Fertigstellung der Baumaßnahme. Einen Zeitpunkt zur Abnahme kann ferner nicht bestimmt werden. Das Gesamtwerk ist gemäß Totalunternehmervertrag (TÜ-Vertrag) nicht vollendet. Zur letztendlichen Fertigstellung gehören neben der Bautätigkeit u.a. ebenfalls die Vermessung sowie Dokumentation.

## 5. Ausblick bis 31.12.2024

Fertigstellung der Nacharbeiten sowie Vorbereitung des Abnahmeprozesses. Weiterhin beginnt das Zusammenstellen der Verwendungsnachweise in der entsprechend geforderten Form seitens des Fördermittelgebers.

## 6. Kontaktdaten der DNS:NET Internet Service GmbH

Bei eventuell auftretenden Fragen im Zusammenhang mit dem Internet- oder Telefonanschluss sowie Problemen hinsichtlich der Inbetriebnahme können sich die entsprechenden Anschlussnehmer an den Kundenservice der DNS:NET Internet Service GmbH wenden.

### **Kontaktdaten auf einen Blick:**

<b>Alle Kontaktdaten für Sie im Überblick</b>		
<b>Privatkunden</b> <b>Allgemeine Fragen</b> <b>(Tarife, Verträge, sonstiges)</b>	<b>Geschäftskunden</b> <b>Allgemeine Fragen</b> <b>(Tarife, Verträge, sonstiges)</b>	<b>Inbetriebnahme</b> <b>Fragen rund um die Inbetriebnahme</b>
Telefon: 030 66765 444 <a href="mailto:privatkunden-boerde@dns-net.de">privatkunden-boerde@dns-net.de</a>	Telefon: 030 66765 100 <a href="mailto:geschaeftskunden-boerde@dns-net.de">geschaeftskunden-boerde@dns-net.de</a>	Telefon: 030 66765 103 <a href="mailto:inbetriebnahme-boerde@dns-net.de">inbetriebnahme-boerde@dns-net.de</a>
<b>Havarie &amp; Störungen</b>	<b>Beschwerden &amp; Eskalation</b>	<b>Anfragen von Medienvertretern</b>
Telefon: 030 66765 111 <a href="mailto:support@dns-net.de">support@dns-net.de</a>	<a href="mailto:programmleiter-boerde@dns-net.de">programmleiter-boerde@dns-net.de</a>	Telefon: 030 66765 128 <a href="mailto:presse@dns-net.de">presse@dns-net.de</a>

**Begründung für Status „nicht öffentlich“:** entfällt
